



VALMISTUNEET TYÖT:

Yläpohjan puutyöt pääosin
Katoksen liimapuupalkkiasennus
Iv-konehuoneen pinnoitus

Urakkasopimuksen välitavoite 3 "iv-konehuoneet asennusvalmiit" ,
työvaihe valmistunut 05.04
Urakkasopimuksen välitavoite 1 "vesikatto vedenpitävä" ,työvaihe
valmistuu viikolla 15

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :


Levyväliseinät
Ulkoseinien puurungot+eristys
Viemäriasennus 1. kerros
Iv-kanavienasennus
Betonipintojen esioikaisu
Tasoitetyöt
Vesikaton ponttilauta-asennus
Väliseinämuuraus
Yläpohjan puurakenteet
Sähkön kaapelireittiasennus
Vesikatteen kermiasennus

ALKAVAT TYÖT:

Levyväliseinät 2. kerros
Betonikatsomo
Us-tuulensuojalevyt+koolaus
Lvj-runkoasennus
Iv-konehuoneen pinnoitus



Iv-konehuone 05.04

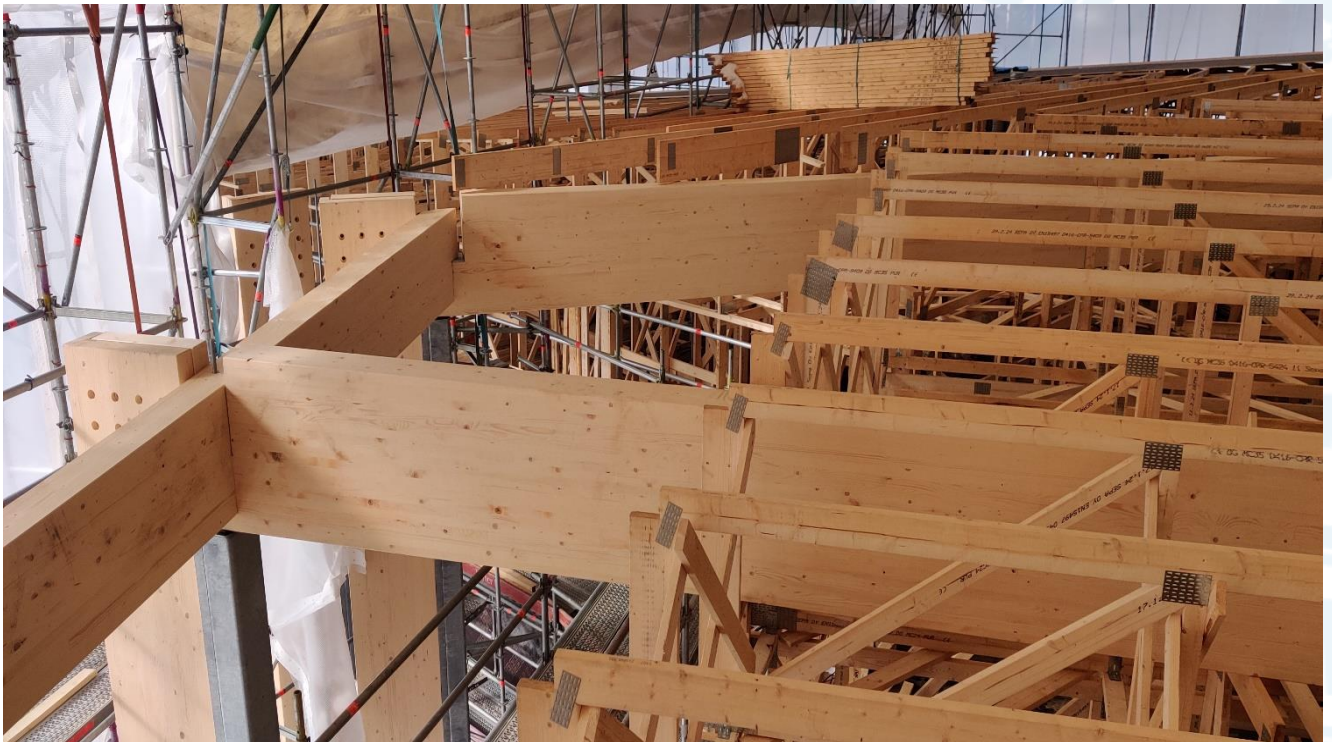

Yläpohjan puurakenteita

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
90,00 %
